

RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-TUGDUAL À SAINT-PABU


La lettre d'information



Un tiers de l'église bientôt invisible derrière les protections !

Quelques points d'étapes depuis fin décembre

9 janvier : reprise du montage de l'échafaudage (ci-contre)

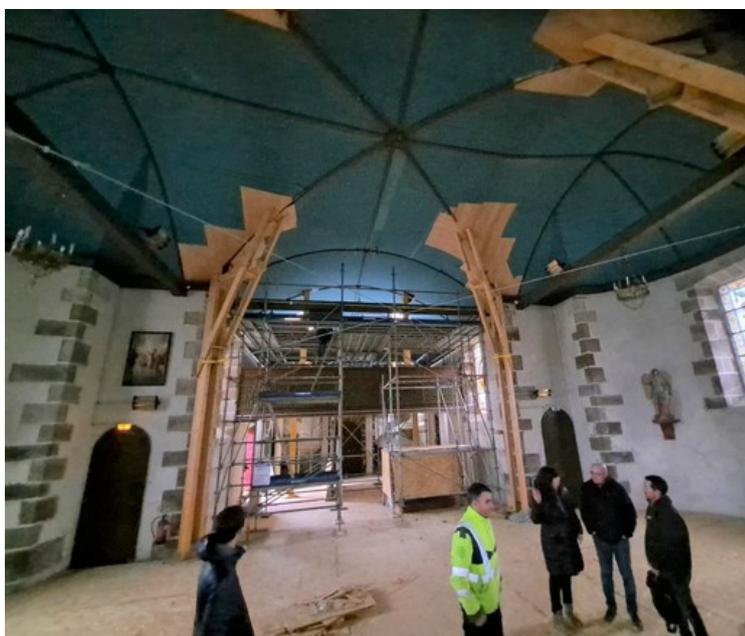

12 janvier : 3ème réunion de chantier : programmation installation échafaudages - parapluie, dépose électricité et voûte lambrissée

18 janvier : début du démontage de la voûte lambrissée et des éléments de charpente non structurels.

Dans le même temps, dépose des lustres en vue de leur restauration



Détail de la charpente



19 janvier : assemblage des fermes du parapluie sur la rue du Bourg, barrée (ci-dessous à gauche)

20 janvier : grutage des 3 fermes du parapluie sur le toit de l'église : aussi spectaculaire que rapide : le montage a été réalisé en 1 heure (ci-contre)



25 janvier : début d'installation du chantier pour la restauration du mur de soutènement du cimetière

26 janvier : quatrième réunion de chantier : clôture réglementaire d'interdiction d'accès au chantier en place. Planification articulation des travaux



La charpente et l'arase de mur à nu



Avec et sans voûte Photo Candio architecte



La couverture du parapluie et les bâches en cours d'installation côté Nord

À venir en février :

Fin de l'installation de la couverture du parapluie et des bâches de protection de l'édifice au niveau de la nef. Dépose et tri des ardoises ; dépose de la charpente

Parallèlement aux travaux de l'église, début visible du chantier de restauration du mur de soutènement du cimetière : démarrage des fouilles la semaine prochaine

L'histoire de l'église et le projet sur : <https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise>

Le suivi des travaux sur facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087309542483>

Au 29 janvier 2023, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine, mécénat) s'élève à 326 851 €, et reste ouverte durant les travaux
