

RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-TUGDUAL À SAINT-PABU

La lettre d'information



Les murs restaurés, la charpente du transept est arrivée !

28 août : les congés terminés, arrivée des maçons de chez Lefèvre pour démarrer les reprises des arases des murs du transept.

Ci-contre, les pierres et la terre sont dégagés côté mur Nord, les pierres de corniches taillées.



7 septembre : réunion de chantier : la restauration des murs se poursuit : plus de 3m³ de pierres et terre ont été évacués par les 2 maçons de chez Lefèvre pour permettre la restauration des arases.

Ci-contre à droite, le mur Sud après enlèvement des pierres et terre, redressement et découpe des pierres de corniches, et préparation d'un fond ciment avant le ferrailage.

14 septembre : réunion de chantier : ci-dessous, les ferrillages sont en place. Les coffrages sont en cours d'installation avant le coulage du béton prévu le 19 septembre.



16-17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine : exposition sur l'histoire de l'église depuis 1761, les aménagements et travaux d'entretien depuis 250 ans, et 130 photos du chantier, pour la plupart inédites.

21 septembre : réunion de chantier : les poutres béton sont coulées, décoffrées et quasi sèches. À noter la légère différence de niveau du mur Sud (ci-dessous à gauche) plus bas que le mur Nord (ci-dessous à droite) : un rattrapage a été fait pour obtenir une planéité parfaite pour la future charpente. Les élus ont pu découvrir ce 21 septembre la charpente en fabrication lors d'une visite aux Ateliers DLB.



Ce même 21 septembre : rencontre de 47 élèves de nos 2 écoles primaires avec l'architecte du patrimoine : alternant voyage dans le temps, explications sur l'histoire de l'église et de sa charpente, la géométrie, la géologie, la signification des mots, l'architecte a su embarquer les jeunes dans cette histoire de restauration : un beau moment d'échanges qui suscitera peut-être des vocations chez certains des jeunes, qui ont hâte de visiter l'église après les travaux.



25 septembre : arrivée de la charpente au Bourg : plusieurs éléments sont grutés en haut de l'échafaudage, les autres au sol derrière les grilles de chantier.





Grutage des éléments des fermes



Grutage d'une des 4 poutres d'entrait



Grutage d'autres éléments de charpente




Grutage d'une des 3 demi-fermes

27 septembre : après un travail préparatoire le 26 septembre, les 3 charpentiers des Ateliers DLB guident le grutier dans le montage de la pièce maîtresse de la charpente : une poutre pesant pas moins de 900 kg, supportée par 2 fermes, qui assurera la planéité du faîtage du transept : impressionnant !



Grutage de la poutre maîtresse du transept

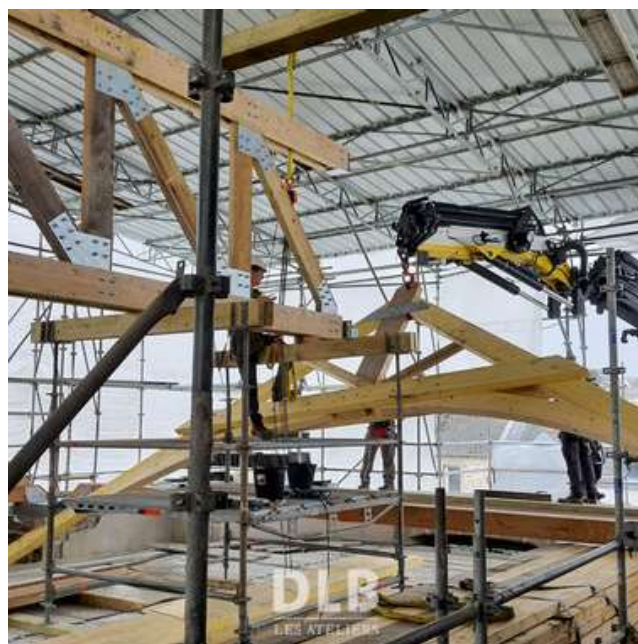

Assemblage de la ferme à la poutre maîtresse

L'accès au cimetière du bas reste interdit durant la restauration de l'église, même durant la Toussaint. **Prochaine lettre d'information début novembre**, avec un reportage sur le montage de la charpente qui sera alors achevée.

Crédit photos Commune de Saint-Pabu (sauf la dernière Ateliers DLB)

Point sur les subventions : Subventions obtenues :

État	Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)	88 213 €
Département	Volet 2 du Pacte Finistère 2030	90 000 €
Département	Restauration des boiseries du chœur	3 119 €
Sauvegarde de l'Art Français		8 000 €
DRAC	Restauration des boiseries du chœur	1 559 €
Région		50 000 €
Région	Prime « Skoaz ouzh Skoaz »	15 000 €
Total obtenu		255 891 €



D'autres demandes de subventions sont en cours (État, Région...). Aujourd'hui, il reste **455 000 € à la charge de la commune**, pour un budget total dépassant le million d'€.

Un dossier fléché pour la restauration de l'église a été déposé au Club des Mécènes pour 2023.

L'histoire de l'église et le projet sur : <https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise>

Le suivi des travaux sur facebook : <https://www.facebook.com/eglisesainttugdual>

Au 30 septembre 2023, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine, mécénat) atteint 359 922 €, et reste ouverte durant les travaux
