

# RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-TUGDUAL À SAINT-PABU

La lettre d'information



## Les murs restaurés, la charpente du transept est arrivée !

**28 août** : les congés terminés, arrivée des maçons de chez Lefèvre pour démarrer les reprises des arases des murs du transept.

Ci-contre, les pierres et la terre sont dégagés côté mur Nord, les pierres de corniches taillées.



**7 septembre** : réunion de chantier : la restauration des murs se poursuit : plus de 3m<sup>3</sup> de pierres et terre ont été évacués par les 2 maçons de chez Lefèvre pour permettre la restauration des arases.

Ci-contre à droite, le mur Sud après enlèvement des pierres et terre, redressement et découpe des pierres de corniches, et préparation d'un fond ciment avant le ferrailage.

**14 septembre** : réunion de chantier : ci-dessous, les ferrillages sont en place. Les coffrages sont en cours d'installation avant le coulage du béton prévu le 19 septembre.



**16-17 septembre** : Journées Européennes du Patrimoine : exposition sur l'histoire de l'église depuis 1761, les aménagements et travaux d'entretien depuis 250 ans, et 130 photos du chantier, pour la plupart inédites.

**21 septembre** : réunion de chantier : les poutres béton sont coulées, décoffrées et quasi sèches. À noter la légère différence de niveau du mur Sud (ci-dessous à gauche) plus bas que le mur Nord (ci-dessous à droite) : un rattrapage a été fait pour obtenir une planéité parfaite pour la future charpente. Les élus ont pu découvrir ce 21 septembre la charpente en fabrication lors d'une visite aux Ateliers DLB.



**Ce même 21 septembre** : rencontre de 47 élèves de nos 2 écoles primaires avec l'architecte du patrimoine : alternant voyage dans le temps, explications sur l'histoire de l'église et de sa charpente, la géométrie, la géologie, la signification des mots, l'architecte a su embarquer les jeunes dans cette histoire de restauration : un beau moment d'échanges qui suscitera peut-être des vocations chez certains des jeunes, qui ont hâte de visiter l'église après les travaux.



**25 septembre** : arrivée de la charpente au Bourg : plusieurs éléments sont grutés en haut de l'échafaudage, les autres au sol derrière les grilles de chantier.





*Grutage des éléments des fermes*



*Grutage d'une des 4 poutres d'entrait*



*Grutage d'autres éléments de charpente*




*Grutage d'une des 3 demi-fermes*

**27 septembre** : après un travail préparatoire le 26 septembre, les 3 charpentiers des Ateliers DLB guident le grutier dans le montage de la pièce maîtresse de la charpente : une poutre pesant pas moins de 900 kg, supportée par 2 fermes, qui assurera la planéité du faîtage du transept : impressionnant !



*Grutage de la poutre maîtresse du transept*

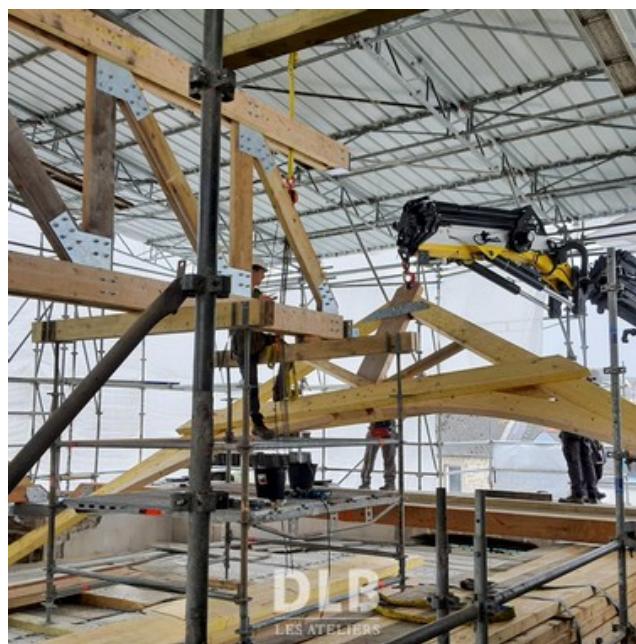

*Assemblage de la ferme à la poutre maîtresse*

**L'accès au cimetière du bas reste interdit durant la restauration de l'église, même durant la Toussaint. Prochaine lettre d'information début novembre**, avec un reportage sur le montage de la charpente qui sera alors achevée.

Crédit photos Commune de Saint-Pabu (sauf la dernière Ateliers DLB)

**Point sur les subventions** : Subventions obtenues :

État	Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)	88 213 €
Département	Volet 2 du Pacte Finistère 2030	90 000 €
Département	Restauration des boiseries du chœur	3 119 €
Sauvegarde de l'Art Français		8 000 €
DRAC	Restauration des boiseries du chœur	1 559 €
Région		50 000 €
Région	Prime « Skoaz ouzh Skoaz »	15 000 €
<b>Total obtenu</b>		<b>255 891 €</b>



D'autres demandes de subventions sont en cours (État, Région...). **Aujourd'hui, il reste 455 000 € à la charge de la commune**, pour un budget total dépassant le million d'€.

Un dossier fléché pour la restauration de l'église a été déposé au Club des Mécènes pour 2023.

L'histoire de l'église et le projet sur : <https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise>

Le suivi des travaux sur facebook : <https://www.facebook.com/eglisesainttugdual>

**Au 30 septembre 2023, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine, mécénat) atteint 359 922 €, et reste ouverte durant les travaux**
